

项目管理规范

部 门：项目管理部

日 期：2026年07月05日



目录

一、项目管理体系介绍


二、项目立项管理

三、项目过程管理

四、项目收尾管理



泰豪项目管理体系建设包含1套方法、2项监控、1项赋能、1项保障。

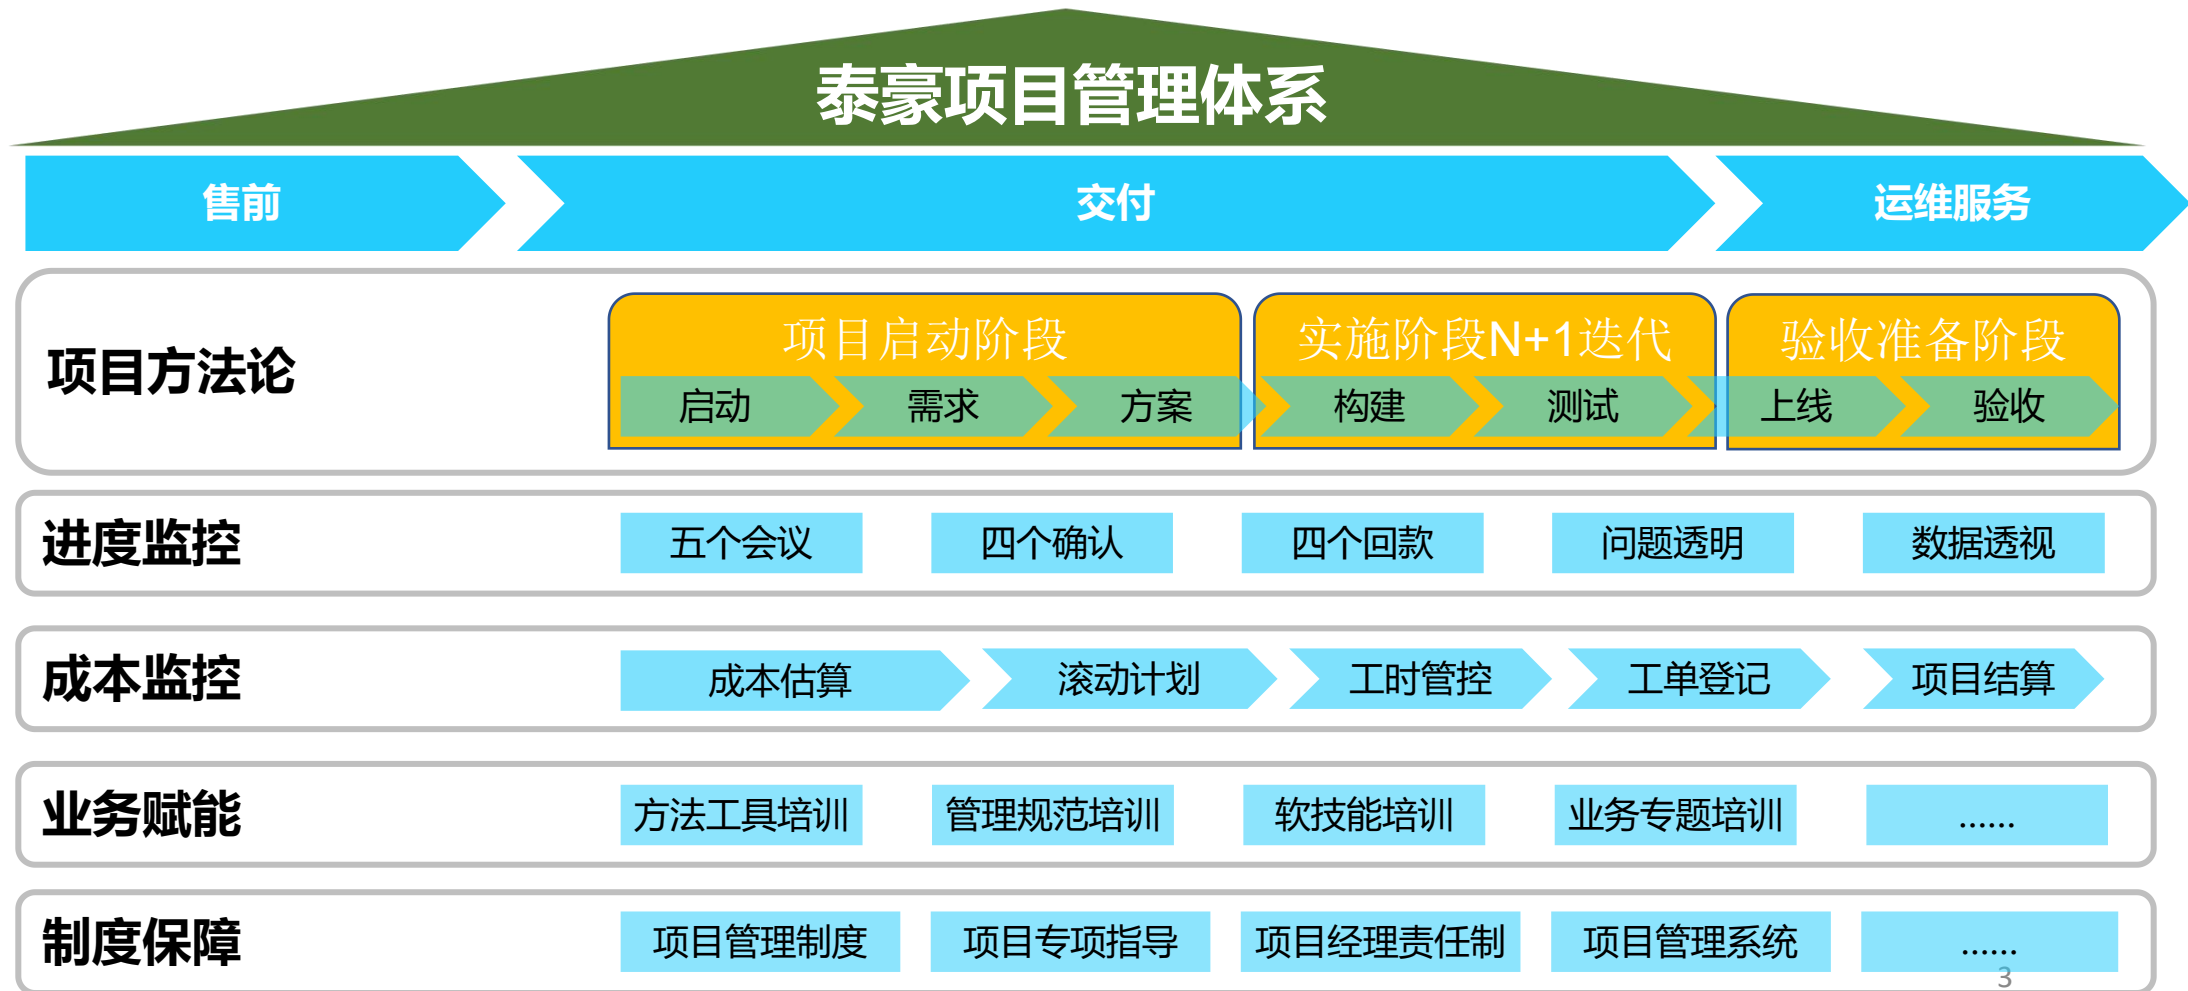


《项目管理指南》涵盖七个阶段12个控制点和34个重点项，通过5个会议、4个要求、4个确认全程监控项目偏差，发现问题及时纠偏。

	售前	启动	需求	设计	构建	测试	上线	验收
目标	售前衔接与规范导入		管控研发投入与范围		管控测试质量与风险		管控上线问题与验收	
会议	预/实施立项评审会		设计评审会		上线培训会		验收会、异常关闭评审会	
要求			开发管控（TFS）		上线申请、上线时间		问题清零	
确认			需求确认		测试确认、上线确认		验收确认	
重点事项	1、项目立项 2、人天预算 3、成本预算 4、费用预算 5、风险管理 6、立项会 7、合同 8、技术协议 9、售前移交		1、需求调研 2、范围管理 3、变更管理 4、需求控制 5、方案设计 6、需求确认 (需求沟通纪要) 7、开发控制 8、实施方案会 9、工时填报		1、环境搭建 2、定制开发 3、测试用例 4、系统测试 5、功能验证确认 (纪要) 6、汇报执行 7、上线申请 8、上线时间 9、上线确认		1、验收确认 2、问题跟进 3、组织验收 4、验收会 5、绩效评价 6、运维交接 7、项目结项 8、异常关闭	

03 进度监控-五个会议

泰豪软件股份有限公司

重点跟进4+1个会议，专项检查项目执行情况，及时向相关管理人员预警偏离，并协助与跟进问题彻底解决。

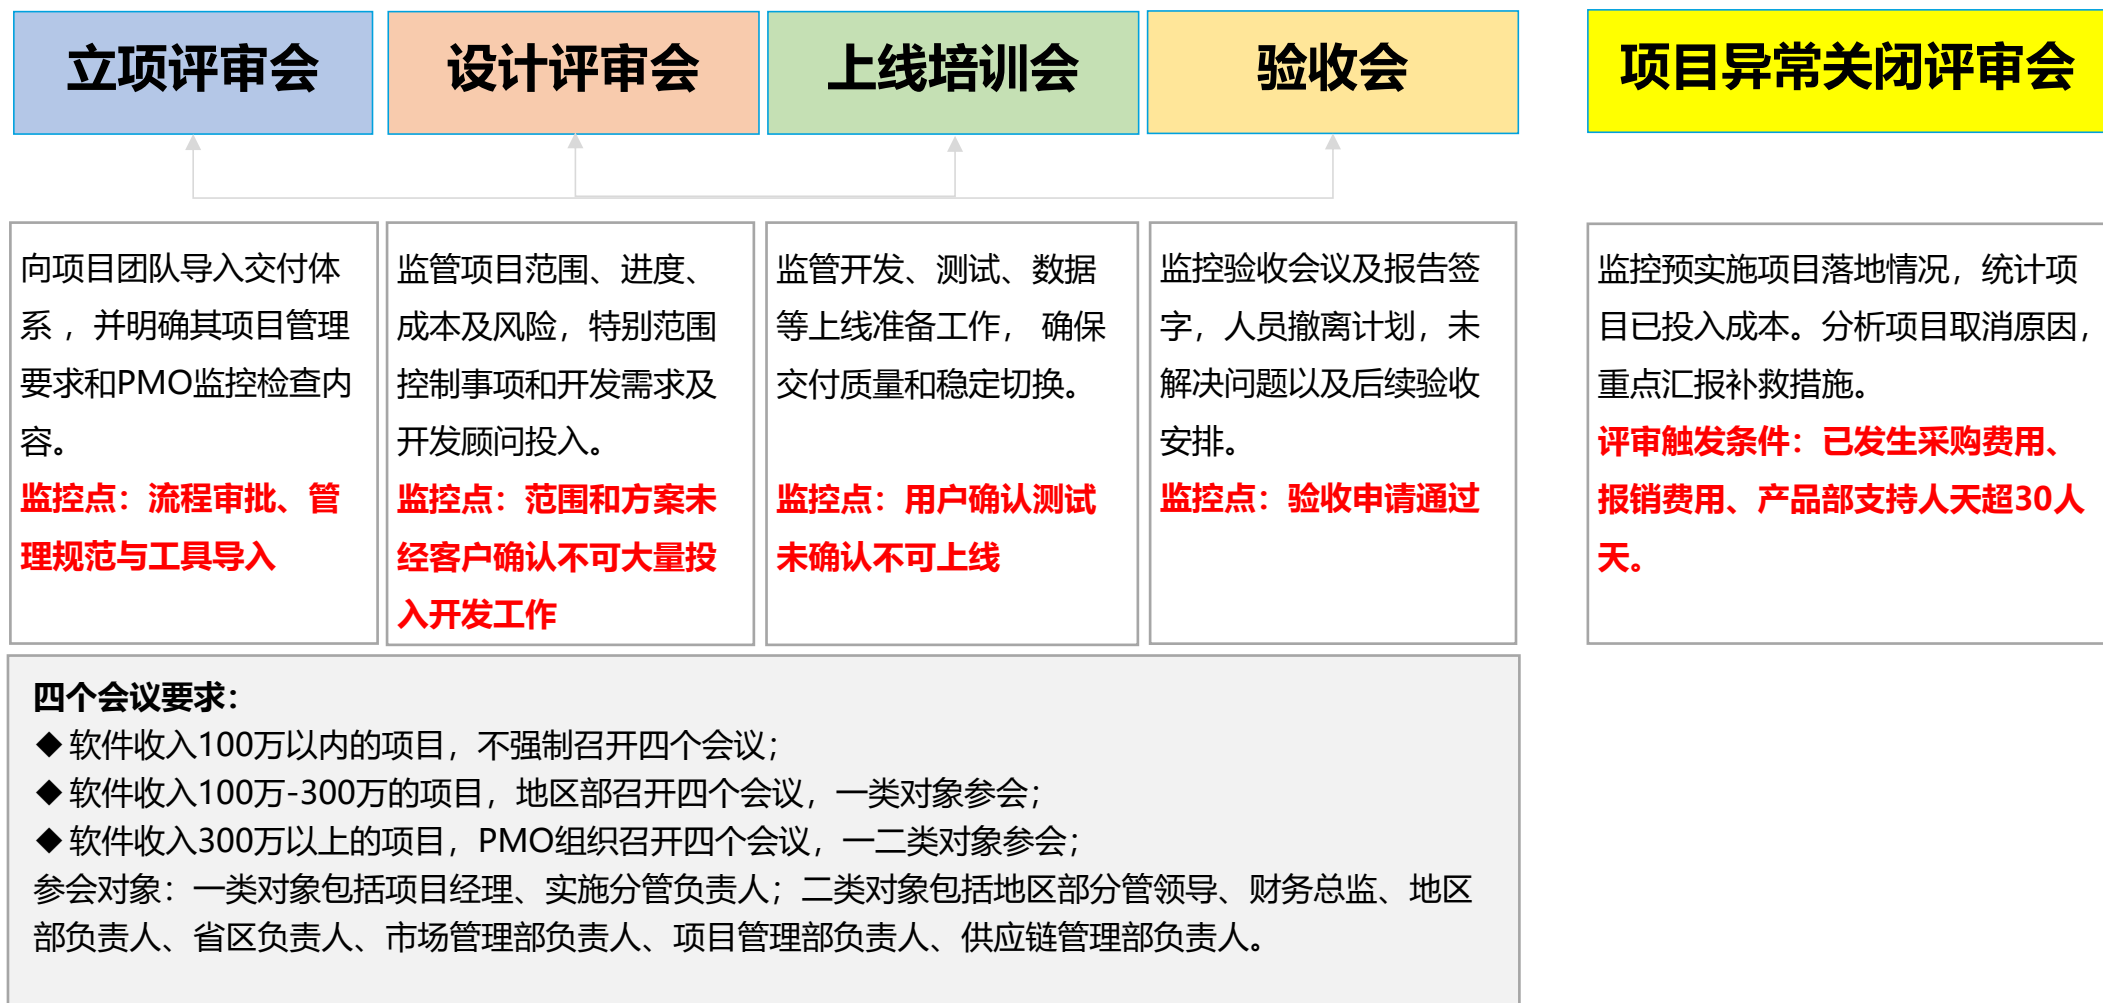

4个确认用来控制项目进度主线，作为关键里程碑与责任制挂钩

需求确认

需求指《客户化需求设计说明书》（含原型设计）。**项目经理需要客户确认《客户化需求设计确认单》后才可构建系统。**

测试确认

用户测试通过后，项目经理需编制《用户确认测试报告》；用户测试确认是**上线切换的必要条件**。

上线确认

系统上线运行三个月内，项目经理需安排客户签字**《上线试运行报告》**。

验收确认

项目经理是项目验收的第一责任人，负责组织客户召开验收汇报会，**并要求客户签署《验收报告》**。

项目管理部重点监控4个回款的情况，确保项目回款正常，从而保障公司利益。

回款结构化

序号	阶段	比例 (例子)	金额
1	首付款	30%	
2	上线款	30%	
3	验收款	30%	
4	质保款	10%	

在合同中对回款期数结构化

回款跟催

销售经理
负责

首付款

销售经理
负责、项目
经理协助

上线款

验收款

质保款

销售经理与项目经理协同跟催

回款与奖金挂钩



合同回清
验收款

发放前提



项目经理
津贴

《项目经理津贴
发放》



合同回清验收款是项目经理津贴
发放的前提

回款管控

地区部	逾期 应收	应回		实回		回款 比例
		金额	时间	金额	时间	
华东		...	...	...	...	...
华南		...	...	...	...	...
华中		...	...	...	...	...
西南		...	...	...	...	...

逾期应收、高风险重点管控

目 录

一、项目管理体系介绍

二、项目立项管理

三、项目过程管理

四、项目收尾管理





市场立项

市场立项是指项目线索跟进有一定结果，如项目储备入库、可研批复已经下达或资金已经下达类的项目。



预实施立项

预实施项目是指尚未中标或未签订合同，需提前进场开展实施工作类项目。



实施立项

实施项目是指已中标或已签订合同，正常开展实施工作类项目。

02 市场立项流程

泰豪软件股份有限公司

市场立项流程



说明：1、**重大项目**定义为立项金额达千万、极具行业战略意义。
2、存在一定比例外包或纯商务合作等情况的项目均需组织线下评审会议。

先立项后实施

所有项目均需进场实施前先在运营管理系统中按项目类型发起对应的（预）实施立项。

获取预实施佐证材料

因项目实际情况需提前进场的，须尽量获取客户侧佐证材料。无法取得外部佐证材料的，原则上至少应当有内部佐证材料。

立项为管理基线

项目立项是财务核算成本的起点。未在系统中发起立项项目，不能进行项目派工、工时填报，以及申请公司研发资源支持和报销项目相关的差旅等费用。

实时更新立项数据

项目中标后需及时发起项目实施立项，前期已进行预实施立项的应即时转为实施立项并更新合同金额、项目预算数据及相关项目信息。

预实施项目立项:

因项目实际情况需提前进场的，须尽量获取客户侧佐证材料。无法取得外部佐证材料的，原则上至少应当有内部佐证材料。同时项目经理需在预实施立项流程中上传相关佐证材料。

预实施项目立项

01

外部佐证材料应至少有以下内容：

- 1) 经客户确认的《提前进场说明函》
- 2) 经客户确认的《预实施项目开工报告》
- 3) 客户侧组织的项目启动会会议纪要文件
- 4) 与客户沟通提前进场实施的微信记录等

02

内部佐证材料应至少包含以下内容：

- 1) 公司内部启动会会议纪要文件
- 2) 项目预实施可行性文档

实施项目立项

时间要求

项目中标后需在**一周内**发起项目实施立项，前期已进行预实施立项的应即时转为实施立项并更新项目预算及相关项目信息。

填写要求

研发实施类项目立项需上传实施方案，明确成本预算、成本会审、项目简介及目标、项目交付验收标准、项目风险及应对措施、项目里程碑、项目交付物等信息。

里程碑要求

项目经理需请按项目实际情况填写项目里程碑开始时间及计划完成时间，启动阶段开始时间节点做为项目开始**报工起点**。

04 (预) 实施立项流程

泰豪软件股份有限公司

(预) 实施立项流程

省区销售经理

各省区**销售经理**负责（预）实施立项的**发起**及各项核心数据的**填写**

省区经理

项目预算校核；
费用、成本审批。
盈利、交付等风险评估。

产品经理


参与**产品线相关项目方案**可行性、资金预算、技术外包合理性、研发交付风险点的**评估**。（**按需触发**）

财务部

审核项目相关**成本、利润**等数据及风险点。超出公司财务核算管理要求的项目，由财务部判断是否触发总裁审批节点。

总裁

超出公司财务核算管理要求的项目，由财务风控部判断是否触发总裁审批节点。
有一票否决权。

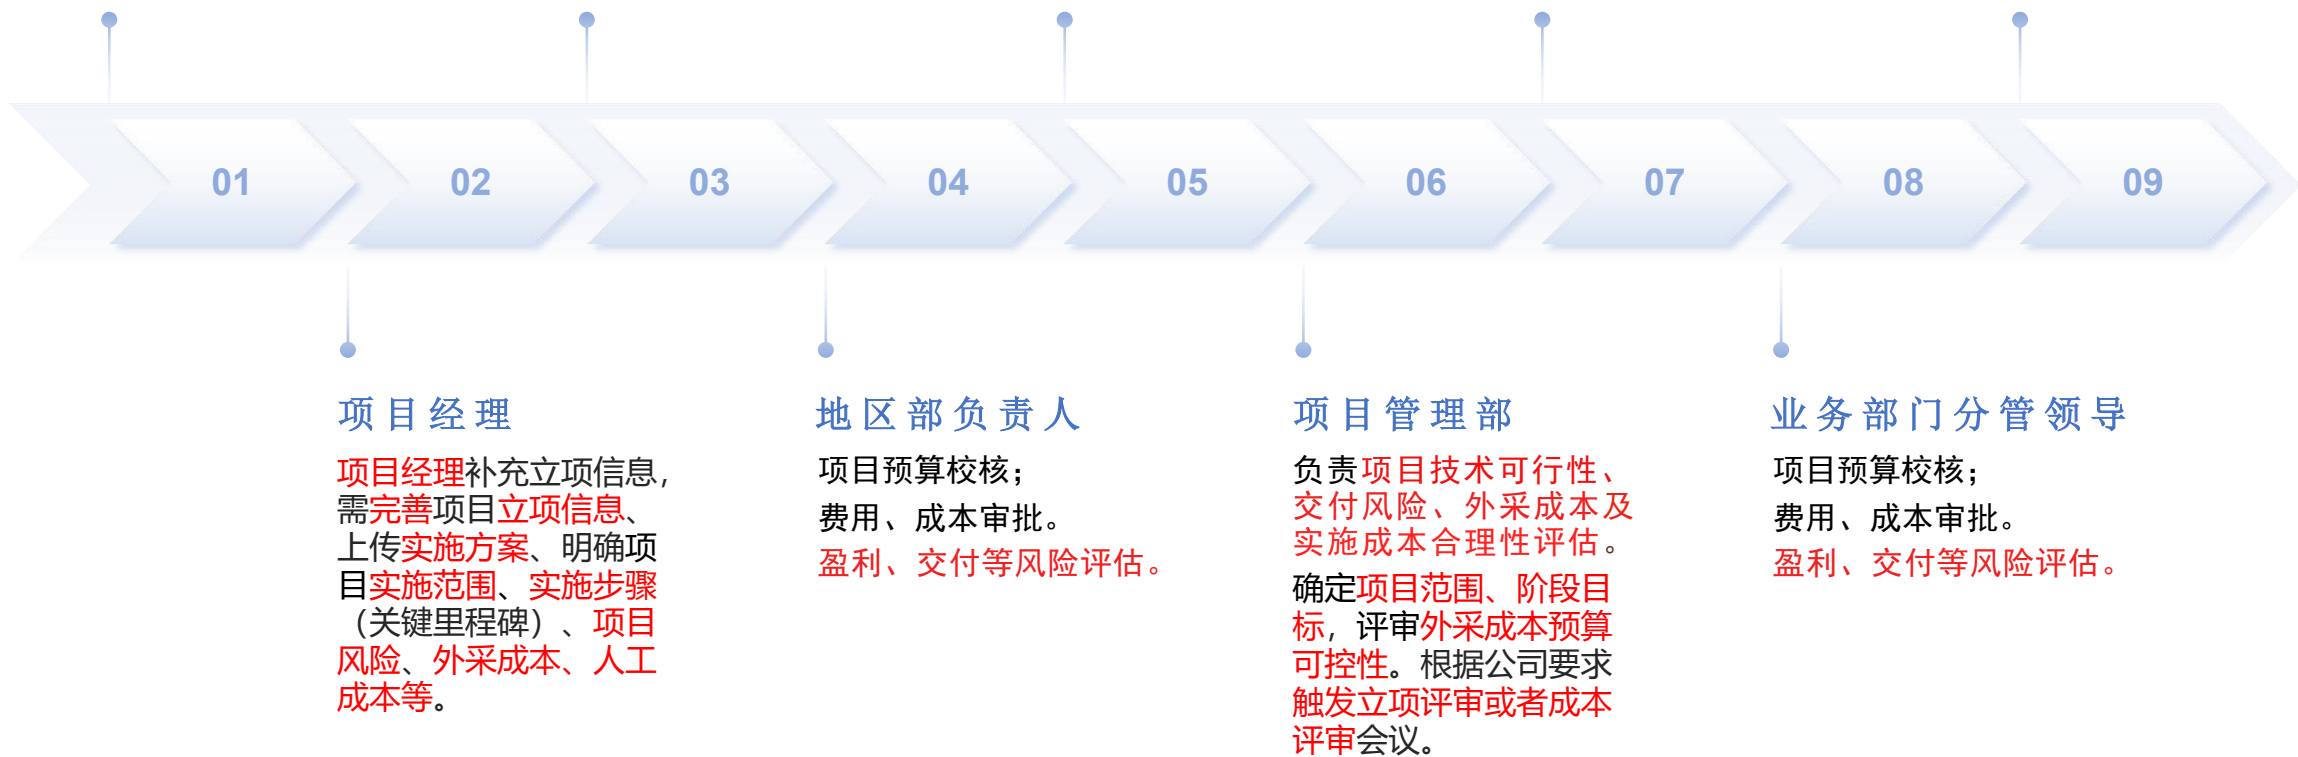

说明：1、根据项目管理要求，触发立项评审或成本评审条件的项目，均需组织线下评审会议。

项目立项表为项目盈亏基线和项目绩效依据，不得随意调整；若调整则需发起立项变更，经地区部及项目管理部审批。

实施立项

基本信息

项目	国网西宁供电公司自主巡航式配网调度业务优化及应用		
地区部	西南地区部	实施项目名称	国网西宁供电公司自主巡航式配网调度业务优化及应用
省区	青海	项目经理	邓素琴
城市	西宁	产品经理	熊为强
销售经理	段伟峰	实施项目编号	TH(G)01011-2035
技术经理		付款方式	其他可填 未知
客户单位	北京科东电力控制系统有限责任公司	项目合同额 (万)	118.30
客户联系人	唐	增值税率	6.0 %
项目类型	研发实施	项目收入 (万)	111.60
合同类型	自营项目-合作交付	软件收入 (万)	59.71
所属产品线	调度产品线	软件收入占比	53.50 %
产品名称	电网运行指挥自主巡航	项目净利润 (万)	18.52
预计投入人数	4	项目净利润率	16.59 %
是否规划退税	否	预计工作量 (人天)	210

项目涉及软硬件采购、技术外包、接口费、测评费用及知识产权费用

项目经理填写

软硬件采购 软件技术外包、接口费 委外测试费 知识产权费用（专利、论文、软著） 实施/开发人工成本									
☐	序号	测试名称	测试内容描述	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）	协调部门	要求完成日期
☐	1	第三方测评	软件测试	套	1	7.00	7.00	青海	2025-12-05
合计							7.00		

费用明细									
成本明细 (原批复值(万))	硬件采购	技术外包、接口费	委外测试费用	知识产权费用（专利论文软著）	实施/开发人工成本	差旅及交通费用	会务费用	招待及团建费	其他费用
本次预算值（万）	4.80	35.00	7.00	8.50	9.00	5.00	1.00	1.00	3.58
本次批复（万）	4.80	35.00	7.00	8.50	9.00	5.00	1.00	1.00	
已发生（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
批复金额（元）	48000.00	350000.00	70000.00	85000.00	90000.00	50000.00	10000.00	10000.00	35800.00
申请（元）	48000.00	350000.00	70000.00	85000.00	90000.00	50000.00	10000.00	10000.00	35800.00
使用合计（元）	16999.00	0.00	0.00	31500.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00

项目成本会审

一、合同类型：自研项目-自主交付、自研项目-合作交付

预实施立项	☒ 是 ☐ 否	市场价格是否专项评审	☐ 否
项目技术外包、接口费成本：60.00 万元		新增技术外包、接口费成本：-25.00 万元	
投标前项目成本会审	☐ 是 ☒ 否	新增技术外包、接口费成本：-25.00 万元	
项目技术外包、接口费成本：35.00 万元		新增“委外测试费用”成本：-0.50 万元	
项目“委外测试费用”成本：7.00 万元		新增“知识产权费用”成本：-1.50 万元	
项目“知识产权费用”成本：8.50 万元			
项目成本取值规则、变化公式			
1、只针对委外测试费用、技术外包、接口费、知识产权费用 这3项进行成本变化对比			
2、项目“XXX”成本取值“费用明细表”中，该费用的“本次批复值”（该项目当前最新批复值）。			
3、实施立项都来源于市场立项或者预实施立项，所以（原）批复按提立项阶段取值“项目信息表”中，市场立项流程中“申请值”或预实施立项中“批复值”			
4、新增“XXX”成本，取“费用明细表”，该费用“本次批复值”-“（原）批复值”。			

二、合同类型：纯商务合作

项目经理需要如实填写项目里程碑计划及对应阶段交付物信息

项目里程碑

项目里程碑

	序号	项目里程碑	计划开始时间	计划完成时间	交付物	备注说明
☐	1	项目启动	2025-10-17	2025-10-19	启动会	
☐	2	需求确认	2025-10-20	2025-10-24	需求说明书	
☐	3	方案确认	2025-10-25	2025-10-31	原型设计	
☐	4	项目构建	2025-11-01	2025-11-30	程序包、脚本、部署手册、管理员手册、操作手册、数据字典	
☐	5	系统测试	2025-11-01	2025-11-30	测试报告、三方测评	
☐	6	系统上线	2025-12-01	2025-12-05	运行报告	
☐	7	系统验收	2025-12-06	2025-12-31	验收报告	

项目里程碑

需求文档

☐ 运维服务计划

技术文档

☒ 公司项目启动或推进文件

☒ 需求（变更）说明书及评审意见（若有变更需提供）

☒ 系统设计报告及评审意见（概要设计、详细设计）

☒ 数据字典或数据库设计说明书

☒ 测试报告

☐ 用户确认测试报告

☐ 第三方测试报告（若有需提供）

☒ 实施方案

☒ 用户手册

☒ 系统部署方案

☒ 系统管理员手册

☐ 系统应急预案及快速恢复方案（若有需提供）

上线文档

☐ 上线试运行申请单

☐ 用户使用反馈报告

☒ 上线试运行报告

☐ 账号权限移交确认单

验收文档

☐ 竣工验收申请

项目立项评审应遵守“应评尽评，不重复评审，关注重难点项目”原则

- 1) 新增技术外协成本大于5万元（含）；
- 2) 其他特殊情况；
- 3) 同一项成本未有增补/调整，原则上不重复召开会审。

**已召开市场立项评审会****未召开市场立项评审会**

- 1) 项目软件收入大于300万元（含）；
- 2) 技术服务外协、委外测试、知识产权成本大于20万元（含）；
- 3) 技术难度高、项目风险大的项目。

项目立项评审汇报材料模板

项目实施范围	一
项目业务架构	二
项目功能结构、数据流向	三
项目部署环境	四
实施步骤（关键里程碑）	五
项目预算及利润率分析	六
项目风险	七



➤ 立项评审会流程

- 1、项目组介绍项目的情况（项目目标、交付范围、技术方案、实施方案、成本分析、项目风险及资源需求）。
- 2、评审组提出意见（质疑重点：四张图合理性（业务架构、功能结构、数据流向和部署环境）、交付目标是否明确、服务外包是否合理、项目风险是否可控等）。
- 3、评审组讨论，总结改进意见、立项结论，项目组确认，形成《立项评审报告书》。
- 4、主持人宣布评审结论。评审结论分为：同意立项、问题整改后同意立项、不同意立项。

项目立项评审报告书

项目名称		项目编号	
申报单位		项目经理人	
成员名单	销售经理： 产品线： 解决方案部： 供应链管理部： 财务风控部： 项目管理部：		
评审意见	2024年X月X日，在南昌组织召开了XXXXX项目实施立项评审会，会议主要对项目文件进行了审查，评审组对项目技术方案、风险、外包、经营数据等情况进行了质询，形成评审意见如下： 1、立项文件☐规范 ☐基本规范 ☐不规范，☐符合 ☐基本符合 ☐不符合评审会所需文件的要求。 2、立项资料改进建议及其他要求： 1） 2） 3、评审组认为该项目。 ☐同意立项 ☐同意完成改进意见整改确认后通过 ☐不同意该项目立项。 评审组成员：		
项目立项评审改进意见确认表			
题及改进意见：（填写说明：将立项评审报告中所列存在的问题生这里）			
分析：（填写说明：介绍出现该问题的原因。）			
及合理性论述：（填写说明：针对所列改进意见要求，介绍采取改进后的全部内容，并必须提供推理依据证明措施的合理性。）			
整改人/日期：			
四、项目管理审核意见：			
项目管理部/日期：			
五、评审组确认意见：			

目录

一、项目管理体系介绍

二、项目立项管理

三、项目过程管理

四、项目收尾管理



重点关注项目范围，双方项目经理要清晰界定项目边界，明确需求定义和工作内容，确保资源投入和高层参与。

控制项目范围

项目经理首先要管控好项目范围，要清晰**掌握十大注意事项**，确保双方理解一致，准确合理评估工作量和资源投入，避免亏损。

界定项目边界

确定项目范围，就是定义项目工作内容和边界，就是明确项目实施目标和主要交付成果。

明确需求定义

项目需求是项目交付的基线，需求不明确将可能出现大量变更，也无法做好实施规划，更不会有合理有效的资源分配和任务安排。

明确工作内容

清晰的工作内容WBS，为项目实施过程所需要花费的费用、时间、资源的准确估算建立了基础。

明确资源投入

资源估算是项目损益基本依据，也是项目成功交付最重要的管理内容，项目经理务必清晰编制与管理资源投入计划。

确保高层参与

需要加强项目决策人之间的沟通，特别是项目发起人，客户高层，业务部室经理的沟通；确保业务部门参与度，尽量牵引业务部门主导项目，管理与控制项目范围。

发出
会议通知

编制
会议材料

完成
会议召开

形成
会议纪要

跟进 问题解决

XXX项目方案会会议纪要

【时间】：20 年X月xx日 14:00-14:30

纪要整理人：XXX

【与会人员】：XXX、.....

不正常原因	使用高级别顾问，后续可使用S2级顾问来降低项目成本
-------	---------------------------

一、纪要内容：

项目风险管理表

The Project Risk Management Table




项目总数

风险总数

风险等级	数里
高风险	1
较高风险	3
一般风险	2
低风险	2
合计	8

发生概率	数量
大	3
中	3
小	2
合计	8

项目风险管理

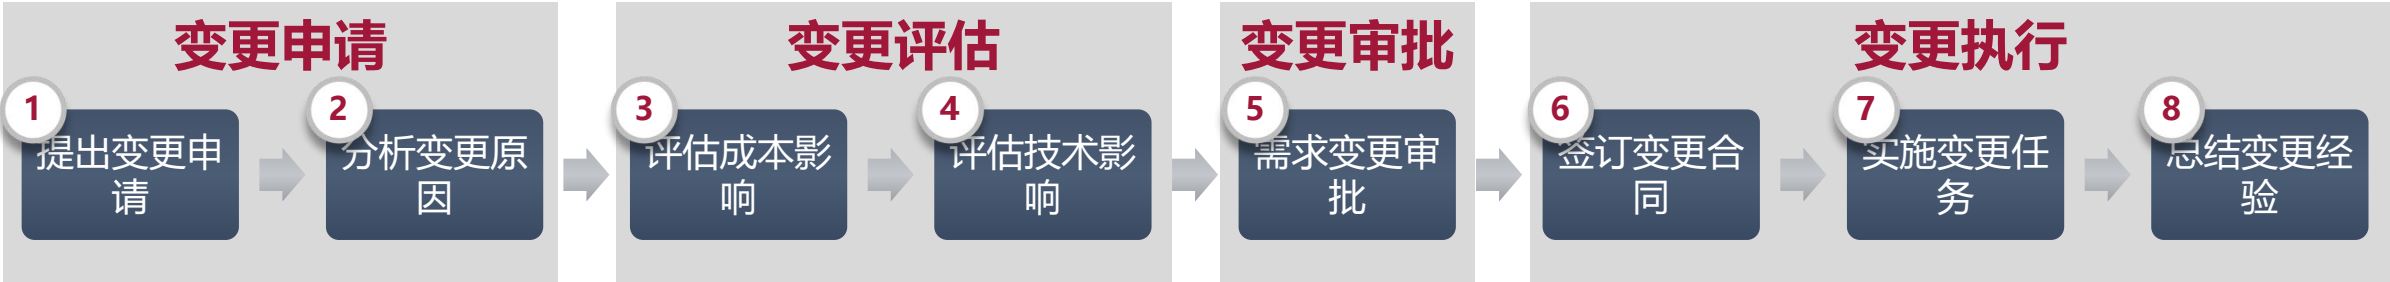

序号	管理事项	管理规定
1	提出变更申请	变更是积少成多过程，任何变更都需书面记录方可受理，无论是否会被接受，也可供以后参考采用；明确需求变更的来源、目的、范围、以及预期实现的成效。
2	分析变更原因	要界定属于项目初期对需求没有明确引发的变更？还是产品范围不清所产生的变更？或是在需求实现的基础上衍生出的新变更？或者因外部事件因素产生的变更？以及需求变更的要求、受限因素、条件和边界，并充分验证变更的必要性。
3	评估成本影响	要深入评估分析变更对项目进度、成本、质量的影响，详细确定相关变更之间的影响关系。
4	评估技术影响	要深入评估变更实现的技术、方案，确定变更执行的实施难度、优先级与风险。
5	需求变更审批	需求变更需要审批，至少应由甲方业务部门领导和IT部门领导签字确认，此变更方可有效。
6	签订变更合同	销售与PM拟定变更合同及变更技术协议，提交双方审批。
7	实施变更任务	制订详细实施计划、资源投入，确保项目按期切换上线。
8	总结变更经验	要记录项目变更所产生和造成的影响，对变更所汲取的教训进行总结分析。

项目立项评审应遵守“应评尽评，不重复评审，关注重难点项目”原则

- 1) 新增技术外协成本大于5万元（含）；
- 2) 其他特殊情况；
- 3) 同一项成本未有增补/调整，原则上不重复召开会审。



已召开市场或预实施立项评审会

未召开市场或预实施立项评审会



- 1) 项目软件收入大于300万元（含）；
- 2) 技术服务外协、委外测试、知识产权成本大于20万元（含）；
- 3) 技术难度高、项目风险大的项目。

地区部	地区部	实施项目名称	
省区		项目经理	
城市		产品经理	
销售经理		实施项目编号	TH(G)0101
技术经理		付款方式	3:6:1
客户单位	国网	项目合同额 (万)	257.00
客户干系人		增值税率	6.0 %
项目类型	研发实施	项目收入 (万)	242.45
合同类型	自营项目-自主交付	软件收入 (万)	105.66
所属产品线	其它业务	软件收入占比	43.58 %
产品名称	其它业务	项目净利润 (万)	41.88
是否规划退税	否	项目净利润率	17.27 %
预计投入人数		预计工作量 (人天)	240
变更类型	☐ 软硬件采购 ☒ 技术外包、接口费 ☐ 委外测试费用 ☐ 知识产权费用 ☐ 实施/开发人工成本 ☐ 差旅及交通费用 ☐ 会务费用 ☐ 招待及团建费 ☒ 其他费用		
变更说明	调增125万技术外包费用		

变更填写说明：请勾选相应的变更类型，变更说明应包含具体哪个预算科目由多少变更为多少，及变更的具体原因



项目异常关闭评审重点关注项目已发生采购成本、已发生财务费用、产品部支持人天及补救措施。

一

采购成本

项目已发生采购费用，包括但不限于软硬件采购、技术外包采购、委外测试费用、知识产权费用。

二

费用报销

项目已发生费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、会务费、项目团建费。

三

产品部支撑

产品部投入人工成本大于30人天。





04 项目异常关闭线下评审条件

泰豪软件股份有限公司

项目取消原因

- 1、由于发榜方XX电网有限责任公司未能兑现向揭榜方支付不低于项目科技投入总额50%的资金。XX省科技厅对该项目进行撤销立项处理。
- 2、2022年第二批科技项目入库失败，客户无法落实资金，又收到XX省科技厅的撤销立项处理，错过了重大项目立项机会，失去了创新热点和领导支持，后续未考虑该项目立项了。

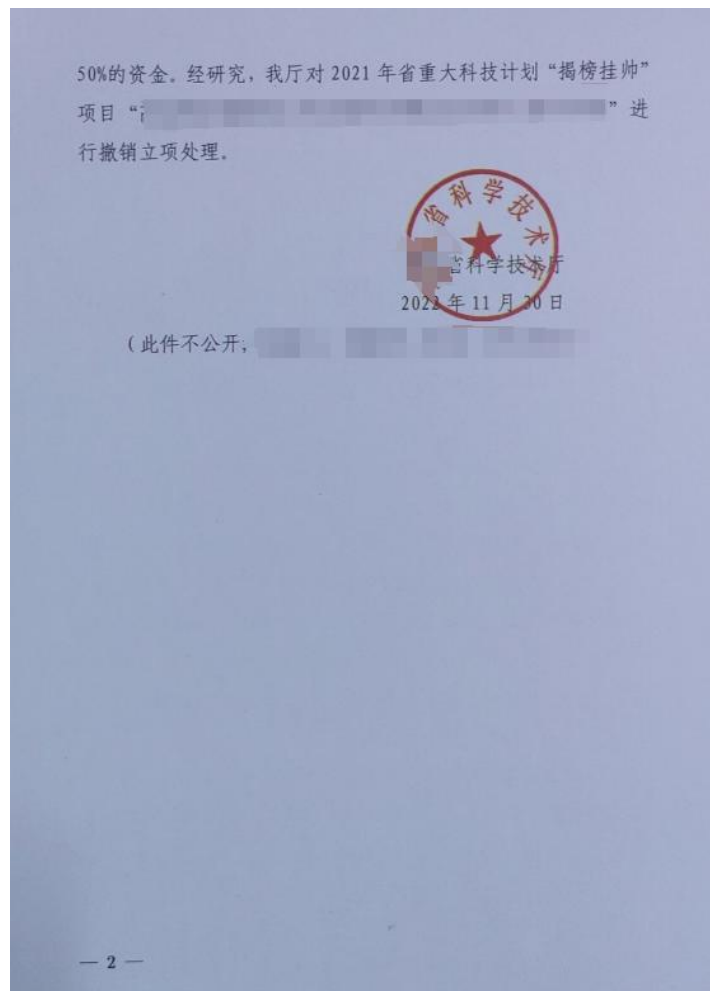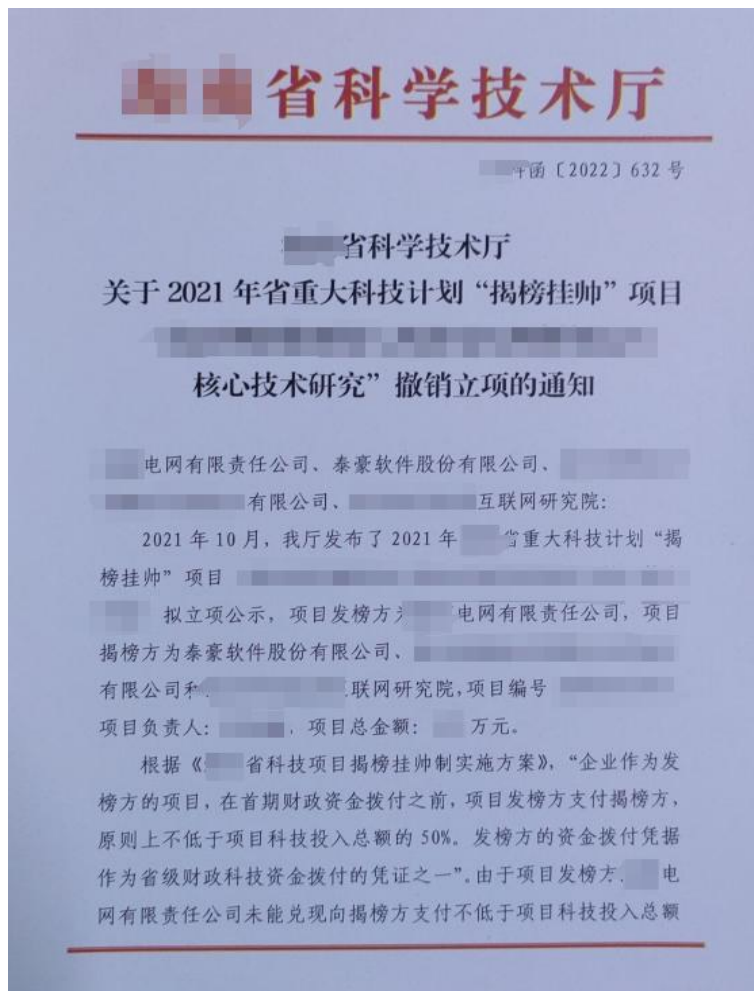

目 录

一、项目管理体系介绍

二、项目立项管理

三、项目过程管理

四、项目收尾管理



项目验收会是项目整个生命周期中一个非常重要的里程碑，验收会的召开意味着客户对项目交付的基本认可，因此需要召集项目相关各方或专家来达成共识。



- 确定验收时间和地点;
- 确定参加验收的部门及人员（甲乙双方、监理方、外部专家）；
- 验收会材料的准备（验收文档准备、验收报告PPT准备、会议议程准备）；
- 验收报告（提前准备一式二份）

- 双方项目经理组织业务部门或外部专家召开项目验收会;
- 项目经理进行项目总结、双方高层总结发言;

- 双方项目经理在实施（开发）完成确认单上签字确认;

项目验收前关键注意事项：

多方合作

- 商务合作需提前关注下游厂商工作是否完成；
- 上游厂商有无要求背靠背验收。

明确要求

- 有无知识产权、第三方测评报告要求；
- 业主方有无刚性的流程（如上线3个月）；
- 业主方是否按批次验收。

合同制约

- 有比较明确的周期要求，如运维项目（需运维周期满）；
- 明确的跨年项目（如有些调度的技改项目或科研项目）。

- 验收报告的基本要素至少包括：**验收项目内容、验收单位名称、盖章、签字、验收日期**。由于客户单位自身管理流程、用印规范等原因无法盖章的，需出具书面说明，并能对签字人员的身份进行确认（例如名片、OA系统截图、邮件后缀签名等信息），以明确签字人员的真实性以及有权代表客户单位验收。
- 针对个别因客户原因，无法取得要素齐备的验收报告原件，但项目已完工并完成验收工作，符合收入确认条件的项目，项目经理应当需编制“**非标准验收证明情况说明**”，经过省区经理、地区部负责人审批后，扫描成电子版，连同取得的非标准验收报告单电子版，在“验收报告单上传”处作为附件上传，经项目管理部、财务部审核后入账。
- 非标准验收证明情况具体包括以下情形：**明确无法取得验收报告、验收报告为复印件或扫描件、验收报告无盖章、签字、验收日期等**。
- 每月月底前，项目经理应当将本月确认收入的所有项目在泛微系统中发起收入确认流程，项目管理部、财务部应当在次月10号前完成审批。

水电网公司 2025 年调度指挥网络交互系统功能优化升级项目竣工验收报告

项目名称	水电网公司 2025 年调度指挥网络交互系统功能优化升级项目		
批准文号		竣工日期	2025.07.05
工程概况	本项目通过对调度指挥网络交互系统功能进行功能优化升级，完成了如下功能开发和完善工作：实现集控对象单位管理优化、集控对象人员管理优化、集控对象单位优化、集控对象单位管理优化、集控对象单位管理优化和集控对象单位管理优化。		
施工过程中存在问题及处理情况	无		
监理单位发现问题及整改情况	/		
设计变更及有关情况处理情况	/		
竣工验收发现的问题及处理意见	无		
是否具备投产条件	是		
验收人员签字			
项目施工单位	[盖章]		
项目设计单位			
项目监理单位			
项目管理单位	李 [盖章]		
专业管理部门	[盖章]		

非标准验收材料情况说明

所属省区	华中	客户名称	国电南瑞*****有限公司
所属地区部	江西	项目名称	互联网**服务
项目编号	TH(GJ0101012*****	合同额	1192700.00 (元)
合同号	TH(GJ0101012*****	税率	6%
		收入金额(不含税)	1125188.68 (元)
非标准类型	是/否	情况说明 (如果写“否”需说明原因)	
是否有验收报告	是/否	无报告原因	
验收报告是否原件	是/否	无原件原因	
验收报告是否有盖章	是/否	无盖章原因 (验收采用专家组确认并签字的形式)	
验收报告是否有签字	是/否	无签字原因	
验收报告是否有验收日期	是/否	无日期原因	
申请人： 省区负责人： 地区部负责人： 分管领导：			
对应提交人/审批人签字			



- 项目收到验收报告、满足收入确认条件时，省区、地区部/事业部应当在运营管控系统的项目管理模块发起收入确认流程，完整准确填写相关信息，特别是采购部分的确认，并上传收入确认依据相关附件。
- 收入确认流程完成后60天项目结项，结项后不能再发起采购申请。



收入确认流程

项目: 项目编号: 地区部:

省区: 项目经理: 销售经理:

项目合同立项金额 (元): 0.00 项目收入立项金额 (元): 0.00 是否有待签采购合同: ☒ 是 ☐ 否

项目累计合同签订金额 (元): 0.00 项目累计收入确认金额 (元): 0.00 待签采购合同金额 (元): 0.00

序号	合同编号	合同名称	合同金额 (元)	收入总金额 (元)	合同累计收入确认金额	本次收入确认金额	项目验收报告单日期	验收报告单上传	备注
合计			0.00	0.00					

采购成本执行情况

预计软硬件采购费用 (万)	已签订采购合同的软硬件采购费用 (万)	0.00	软硬件采购费用差额 (万)	0.00
预计技术外包、接口费用 (万)	已签订采购合同的技术外包、接口费用 (万)	0.00	技术外包、接口费用差额 (万)	0.00
预计委外测试费用 (万)	已签订采购合同的委外测试费用 (万)	0.00	委外测试费用差额 (万)	0.00
预计知识产权费用 (万)	已签订采购合同的知识产权费用 (万)	0.00	知识产权费用差额 (万)	0.00


研发实施类/商务合作类项目验收材料

分类	交付物要求	提交项
技术文档	公司项目启动或推进文件	✓
	需求说明书	✓
	系统设计报告及评审意见（概要设计、详细设计）	✓
	数据字典或数据库设计说明书	✓
	测试报告	✓
	用户确认测试报告	
	第三方测试报告（若有需提供）	
	实施方案	✓
	用户手册	✓
	系统部署方案	✓
	系统管理员手册	✓
	系统应急预案及快速恢复方案（若有需提供）	
上线文档	上线试运行报告	✓
	账号权限移交确认单	
验收文档	物资到货单验收单（如有硬件采购需提交）	
	项目总结报告	
	人员撤场确认单	
	验收报告	✓

供应商验收过程材料

		商务外包	技术外包	运维类	设备调试类	接口外包类	人力外包类	宣传视频拍摄	专利技术转让	
阶段	交付物要求	整体技术外包	部分功能外包、工作外包	系统维护（运维、数据治理）	设备调试类	接口外包类	工作量结算等情况	宣传视频拍摄等制作	专利技术转让	
采购申请阶段	采购合同	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	技术规范	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	根据实际情况提供
	交付计划	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	实施方案	✓	✓							
	部署方案	✓								
	接口方案					✓				
过程交付阶段	测试报告	✓	✓							
	上线试运行报告	✓								根据实际情况提供
	调试报告				✓					
	运维记录/运维方案			✓						
	验收报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
验收阶段	成果交付							✓	✓	根据实际情况提供
付款阶段	工作量确认单						✓			

项目总结报告编制重点：

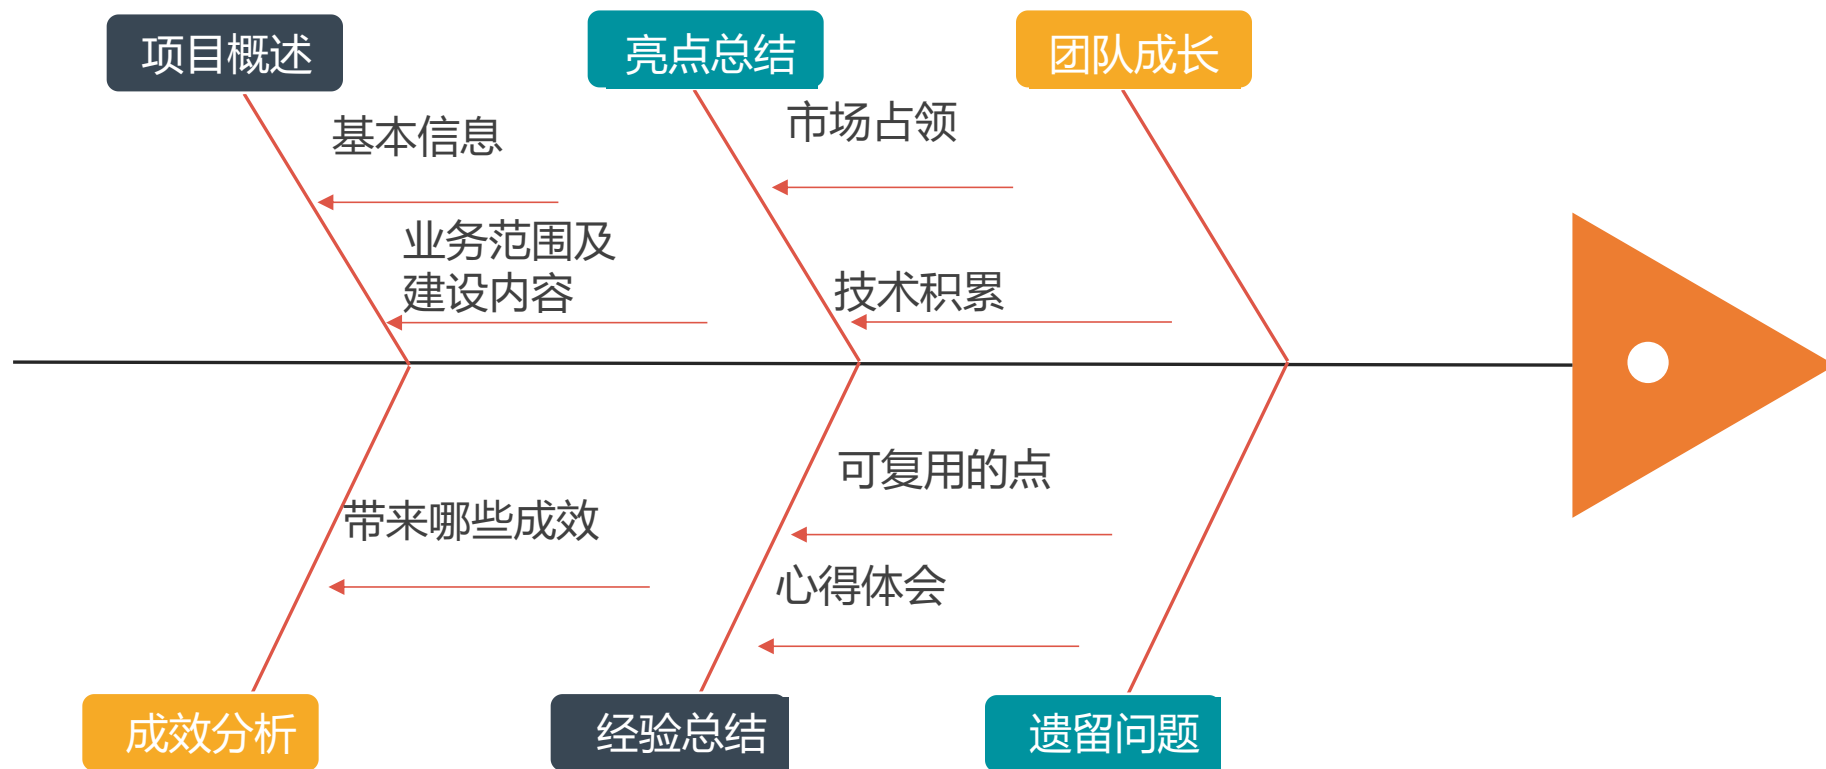

THANK YOU !

谢 谢 聆 听

中国的泰豪，世界的泰豪！
